



## Schullandheim Altkünkendorf

Ein Projekt des Gymnasiums Steglitz  
und des Vereins der Freunde des Gymnasiums

**Informationen zum Baufortschritt  
Schülerprojekte  
Sommerfest**

---

---

---

---

---

---

---

---

*Baubeginn am 8. September 2003*

- Mit dem Betrag von 42.000 Euro, den der Verein der Freunde als Investition in Altkünkendorf bereit stellen konnte, wurden vom Arbeitsamt Eberswalde sechs ABM-Stellen für 64.000 Euro genehmigt.



---

---

---

---

---

---

---

---

*Baubeginn am 8. September 2003*



Zustand der Scheune beim Baubeginn

---

---

---

---

---

---

---

---

*Bauzustand Ende September 2003*



**Der Innenraum muss  
geebnet werden.**

**Dabei muss die  
Balkenkonstruktion,  
die das Dach hält,  
stehen bleiben.**

---

---

---

---

---

---

---

---

*Bauzustand am 16. Oktober 2003*



**Die Fundamente  
im Innenraum  
sind fast fertig.**

**Der Boden ist zu  
70% geebnet und  
mit Kies verfüllt.**

---

---

---

---

---

---

---

---

*Bauzustand am 16. Oktober 2003*



**Die Versorgungsrohre, durch die später einmal Strom und  
Wasser in das Gebäude gelangen werden, sind verlegt und  
werden in Kies eingebettet.**

---

---

---

---

---

---

---

---

*Bauzustand am 16. Oktober 2003*



**Der ehemalige Kellerraum ist verfüllt, die Fundamente sind eingeschalt.**

---

---

---

---

---

---

---

---

*Bauzustand am 27. Oktober 2003*



**Der Schacht für die Versorgungsleitungen ist gemauert.**

---

---

---

---

---

---

---

---

*Bauzustand am 27. Oktober 2003*



**Alle Fundamente im Innenraum des Gebäudes sind komplett fertig.**

**Auf dem Boden ist Kies aufgebracht und geebnet worden.**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 12. November 2003**



Der Feldsteinsockel und die Mauern des Gebäudes werden saniert.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 12. November 2003**



In der rechten Gebäudehälfte ist die Bodenplatte geschüttet worden.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 12. November 2003**



Der flüssige Beton wird verteilt, geglättet und vermessen.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 22. November 2003**



Die Betonarbeiten sind abgeschlossen. Auch in der linken Gebäudehälfte ist die Bodenplatte gegossen. Die Rohrleitungen auf der Badseite wurden eingebaut.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 22. November 2003**



Die Sanierung der Fassade hat begonnen.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 15. Dezember 2003**



Die Qualität der Balken konnte untersucht werden.

Ein großer Teil des Gebälks muss wohl oder übel ausgewechselt werden.

Das Dach ist mit einer Plane bedeckt.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 27. März 2004**



Alle Wände sind von außen saniert. Die Fensteröffnungen sind komplett.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 27. März 2004**



Alle Fenster- und Türöffnungen sind vorbereitet. Die Außenwände sind saniert.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 27. März 2004**



Der morsche Dachstuhl ist abgetragen und wird nun zügig erneuert.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 19. April 2004**



**Der Dachstuhl ist errichtet.**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Richtfest am 23. April 2004**



---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 10. Mai 2004**



**Die Weichfaserplatten sind auf dem Dachstuhl aufgebracht.**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 10. Mai 2004**



Die linke Giebelkronen war fertig gemauert.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 19. Juni 2004**



---

---

---

---

---

---

---

---

**Wiederaufnahme der Bauarbeiten Juli 2006**



- Im Mai erhielten wir die Zusage, dass unser Projekt von Leader+, einem Programm der EU, gefördert wird.
- Der Innenausbau begann im Juli. Zunächst wurden die Innenwände verstärkt und gedämmt.

---

---

---

---

---

---

---

---



**Bauzustand am 9. September 2006**



- Die Fenster waren eingebaut.
- Die Zwischendecke war eingezogen.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 13. Oktober 2006**



- Die Zwischendecke ist komplett fertig gestellt.
- Die Treppe ist eingebaut.
- Der Rohbau im Badbereich des Erdgeschosses ist abgeschlossen.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 13. Oktober 2006**



- Der Rohbau im Badbereich des Erdgeschosses ist abgeschlossen.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 18. November 2006**



Alle Fenster und Türen sind eingebaut.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 18. November 2006**



Die Putzarbeiten im Badbereich haben begonnen.  
Der Schornstein ist nahezu fertig.  
Die Elektroleitungen im Erdgeschoss sind verlegt.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 09. Dezember 2006**



- Schornstein ist fertig
- Entlüftungsrohre sind eingebaut

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 09. Dezember 2006**



- Die Installation der Halterungen für Toiletten und Waschbecken ist weitgehend fertig

•Die Putzarbeiten in diesem Teil sind abgeschlossen.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 09. Dezember 2006**



Die Dämmung im Obergeschoss ist vollständig eingebracht.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 17. Februar 2007**



Putz- und Estricharbeiten sind abgeschlossen

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

**Bauzustand am 5. Mai 2007**



Der Teich der biologischen Kläranlage wurde eingemessen und die Böschungen wurden angelegt.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Schülerprojekte**

**Fahrradschuppen (2001 -2003)**  
**Feldsteinbegrenzung (ab 2005)**

Bei den Projekten wird darauf Wert gelegt, dass Materialien wieder verwendet werden und sich in das ortsübliche Dorfbild einpassen.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Etappen beim Bau des Fahrradschuppens (2001 - 2003)**



---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---

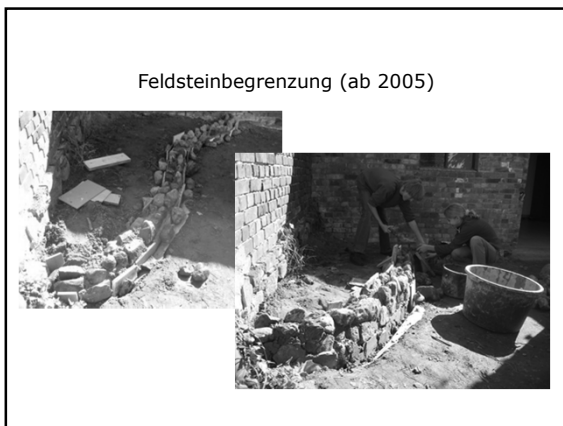

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sommerfeste in Altkünkendorf**

Inzwischen sind unsere Sommerfeste zum festen Bestandteil des Altkünkendorfer Veranstaltungskalenders geworden.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Sommerfest 2005 in Altkünkendorf



Chor des Einstein-Gymnasiums Angermünde in der Kirche

Tombolaziehung durch Günther Jauch vor über 500 Gästen aus Berlin und Angermünde/Altkünkendorf

Wir danken für die gute Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat und der freiwilligen Feuerwehr.



---

---

---

---

---

---

---

---

### Sommerfest 2006 in Altkünkendorf



- Am 16. September konnten wir wieder rund 400 Gäste begrüßen.
- Der weitere Ausbau des Schullandheims war zwei Monate zuvor wieder aufgenommen worden.

---

---

---

---

---

---

---

---
